


OBRAS EM ANDAMENTO

DEZEMBRO/2020

REITORIA

Obras Hospital Universitário 2



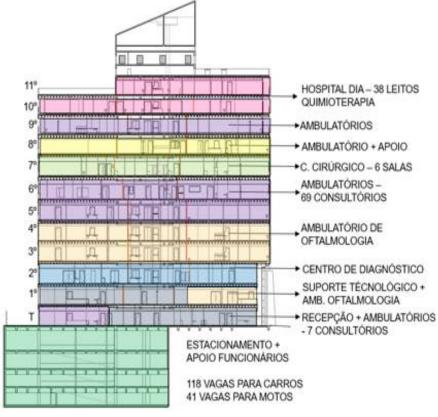

Obras Hospital Universitário 2

HU2	INICIAL	ATUALIZADO
CONTRATO EM 12/15	29.163.223	37.261.309
2015	3.064.711	
2016	20.345.512	
2017	12.200.927	
2018	680.642	
2019	969.519	
VALOR TOTAL EMPENHADO	37.261.309	37.041.844
SALDO DE EMPENHO	219.466	
SALDO DE CONTRATO	0	
VALOR NECESSÁRIO	0	

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN)






Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN)





Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN)

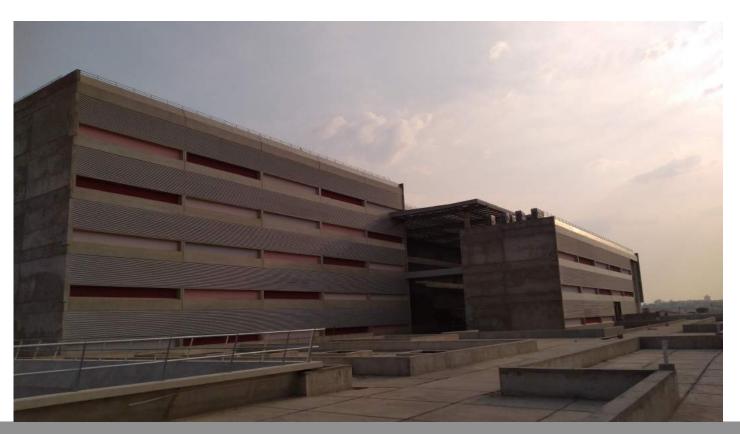

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN

OSASCO	INICIAL	ATUALIZADO
CONTRATO EM 04/07/2016	71.245.639	78.444.401
DADOS FINANCEIROS	EMPENHADO	
2016	10.484.171	
2017	8.550.874	
2019	11.746.887	
2019	11.682.150	
2020	10.299.418	
VALOR TOTAL EMPENHADO	52.763.500	46.229.143
SALDO DE EMPENHO	6.534.357	
SALDO DE CONTRATO	25.680.901	
VALOR NECESSÁRIO	19.146.544	
EFICIÊNCIA ENERGÁTICA	1.056.154	
A EMPENHAR	5.478.203	













DIADEMA	INICIAL	ATUALIZADO
CONTRATO EM 17/10/16	33.429.513	42.336.830
2016	7.475.559	
2017	7.716.242	
2018	10.501.186	
2019	3.901.509	
2020	5.776.438	
VALOR TOTAL EMPENHADO	35.370.933	29.959.641
SALDO DE EMPENHO	5.411.293	
SALDO DE CONTRATO	6.965.897	
VALOR NECESSÁRIO	1.554.604	



Centro Cultural da Saúde Unifesp (Projeto de Modernização da Biblioteca do Campus São Paulo







CENTRO CULTURAL DA SAÚDE UNIFESP IPROJETO DE MODERMOJAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS SÃO PAULOS

Captação Rouanet autorizada





Proponente: FAP-Unifesp Número PRONAC 180463 Aprovado no MinC em 15/03/2018 Valor R\$ 12.025.624.48

Projeto Executivo pronto para iniciar as obras.

Obra em andamento Orçamento licitado R\$ 14,4 milhões Captado até dez/2019: R\$ 7,5 milhões

Expectativa de captação em dez/2020: R\$ 5 a 7 milhões

Medição da obra EXECUTADO: R\$ 1,1 milhões Obra retomada em setembro/20 (suspensão durante primeiros meses da pandemia)

